

**Biblioteken i Norrbottens
resa mot...**

**Nytt biblioteksdatasystem -
Koha**

okt 2019- mars 2022

Marina Eklund
huvudprojektledare för
Region Norrbotten/Biblioteken i Norrbotten
(BiN)

PROJEKTORGANISATION NYA SYSTEM 2022

STYRNING

OPERATIV STYRNING

DELPROJEKTLEDARE

ARBETSGRUPPER

BIBLIOTEKSCHEFER

LEVERANTOR
AVTAL

LEVERANTOR
kringutrustning

STYRGRUPP
NYA SYSTEM

STYRGRUPP
[BIBBLO.SE](#)

STYRGRUPP
BIN

STYRGRUPP
KATALOG

HUVUDPROJEKTLEDARE
REGIONBIBLIOTEKET

Systemgrupp

DELPROJEKTLEDARE
SYSTEM
OVERTORNEA

SAMORDNARE
PORTAL
LULEÅ

DELPROJEKTLEDARE
MEDIER
REGIONBIBLIOTEKET

DELPROJEKTLEDARE
KATALOG

KOMMUNIKATION
REGIONBIBLIOTEKET

Piteå, Boden
Luleå, LTU
Övertorneå
Arjeplog, Haparanda

Piteå
Luleå x 2
Regionbiblioteket

Regionbiblioteket
Arvidsjaur
Boden
Luleå

Haparanda
Gällivare
Boden
Luleå x 2

Regionbiblioteket
Luleå
Kiruna
Piteå



April 2022

system
webb

Metoder
Anpassningar

Samverkan -aktörer

Upphandling jan 2021

Kompetenser i samarbetet

Styrning, finansiering april 2020

Uppdrag, omvärldsanalys okt 2019


FÖRVALTNING

KOORDINERING

MOBILISERING



BIBLIOTEKEN
I NORRBOTTEN

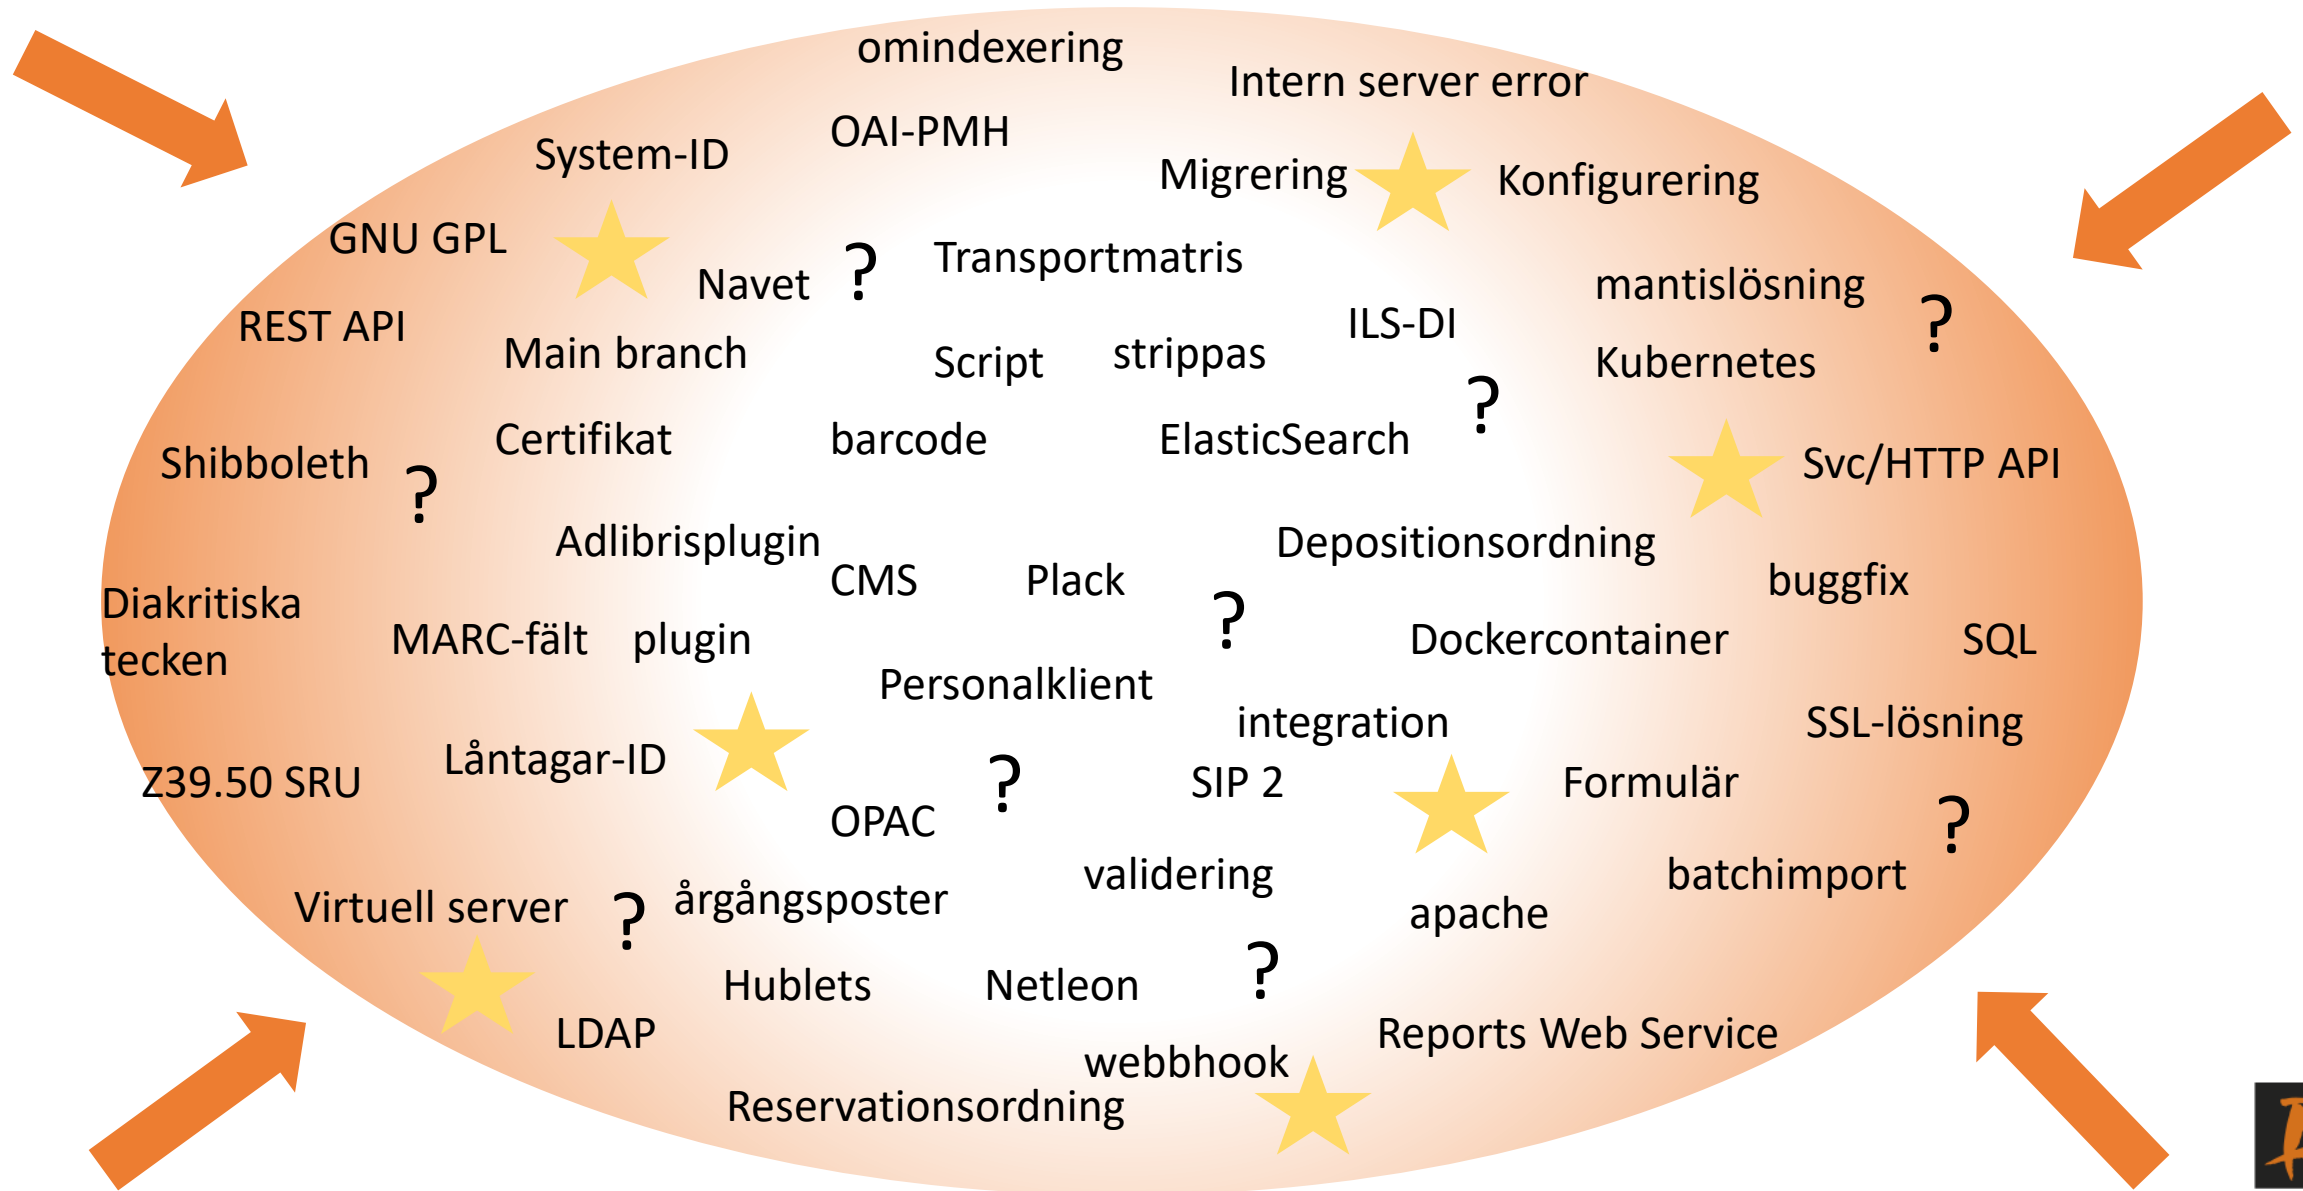



PROTOKOLL

REGION NORRBOTTEN Redovisande dokument | Protokol

Projektit

Implementeringsmöte 4 23 september 2021

Tid och plats
kl. 10.00–11.00 via Teams

Kallade:

Beatrice Löfstrand	Kalle Karlsson
Ingela Karlsson Broström	Crister Karlén
Naib Genbot	Ola Andersson
Maria Thorgren	Anders Fredriksson
Greger Öberg	Marina Eklund
Kai Metsävainio	

Frånvarande:
Ingen frånvarande.

Dagordning

1. Protokoll föregående möten
2. Protokoll från den 9 samt 16 sep. Beslutspunkterna lästes upp utan inläggning. Protokollen läggs till handlingarna.
3. Fler punkter till dagordningen?
 - a) Fråga angående närvarande personer från imCode: Magnus, Jakob, Johan och Hillar?

Beslut: Personerna finns med i Teamskallelsen och deltar i implementeringsmöten då behov uppstår. Detta meddelas implementeringsgruppen inför möten.

 - b) Vilka personer kan imCode kommunicera med/ta ett möte för att kommunicera migreringsresultat? Fråga kring tester, i den här gruppen eller i annan kanal?

Beslut: Systemgruppen kallas av imCode till ovanstående specifika möten/typ av testaktiviteter. Aktuellt om ett par veckor.
4. Information och beslut
 - a) Information från Mötet rörande kringutrustning (22 sep. 2021) Vid mötet deltog Beatrice Löfstrand, Greger Öberg och Kai Metsävainio från

PROJEKT Nya system inom Biblioteken i Norrbotten 2022
PUBLISERINGS DATUM 2021-09-22

OKUMENT-ID P/varsambadspecifika projekt och uppdrag/01-0194000-028
ANSVARIG Anna Eklund Blåre

VERSION 1.0
UPPRÄTTAD AV Anna Eklund Blåre

REGION NORRBOTTEN Redovisande dokument | Protokol

Projektit

Implementeringsmöte 11 18-11 2021

Tid och plats via Teams
kl. 10.00–11.30

Kallade:

Beatrice Löfstrand	Kalle Karlsson
Ingela Karlsson Broström	Crister Karlén
Naib Genbot	Sina Borg
Maria Thorgren	Ola Andersson
Greger Öberg	Anders Fredriksson
Kai Metsävainio	Marina Eklund

Frånvarande:
Sina Borg (jobbar med BIN:s portalprojekt)

Dagordning

1. Protokoll föregående möte

Notera Punkt 5 Tidplan, där har imCode och Region Norrbotten olika minnesbild vad som diskuterades. Inget beslut togs kring ändring i tidplanen. Vi har noterat att: Diskussionen om att senarelägga uppdraget till v 1/2022 har förts under ett annat möte än implementeringsmötet varvid inte samtliga kunde bekräfta informationen om rekommendationen från imCode Partner AB. Konklusionen. Vid det mötet, troligen daterat den 8 november enligt en delegat fördes inga anteckningar. Region Norrbotten avser att följa tidplanen med att gå i skarp drift v 48/49. Maria Thorgren delar imCodes bild gällande rekommendationen att skjuta på skarp övergång till v.1 (Plan B).
2. Fler punkter till dagordningen?
Inga punkter anmäldes.
3. Information och beslut

Mail den 11 november från imCode till Marina Eklund, kring hur vi uppfattat kommunikation och rekommendationer. Målet innehåller förslag och konstaterande om vad som imCode inte kan genomföra för att hinna med tidplanen bl. a.

PROJEKT Nya system inom Biblioteken i Norrbotten 2022
PUBLISERINGS DATUM 2021-09-22

OKUMENT-ID P/varsambadspecifika projekt och uppdrag/01-0194000-028
ANSVARIG Anna Eklund Blåre

VERSION 1.0
UPPRÄTTAD AV Anna Eklund Blåre

NYHETSBLÄDD

BIBLIOTEKEN I NORRBOTTEN

Utskick 10 25 mars 2022

Vad har vi jobbat med/hänt i veckan:
Ta del av nya funktioner och anpassningar i vårt system under föregående vecka.

Sms:
Testerna av sms är slutförda. Det återstår några frågor för leverantören att lösa och sedan ska sms kopplas på i vår riktiga Koha. Om allt går som planerat lägger vi upp en manual som nyhet i Koha under den här veckan.

Påminnelser och krav:
Arbetet pågår med att titta över alla meddelandemallar och göra dem klara så att påminnelser och krav kan börja skickas ut. Målet är att de ska börja skickas den 1/4.

Säkra lösenord:
Efter att vi infört IP-lösning vid inloggning till Koha så går vi nu vidare och jobbar ännu mer med säkerheten. Vi kommer i dagarna att införa att all personal måste skapa säkrare lösenord. Mer information och manual kommer när det är dags.

Plocklistan:
Vissa enheter har problem med att de inte får några träffar i Reservationskyl (plocklistan). Det har visat sig att kalendern i Koha påverkar plocklistan. Om en enhet lags in stängda dagar i kalendern kommer det inte upp några reservationer i plocklistan just den dagen.

Rapport 95, material under transport:
I rapportmodulen finns rapport nr 95, material under transport. Rapporten listar vilka exemplar som är under transport. Kör gärna rapporten och se om ni har exemplar som legat länge under transport.

Pågående testning:
Det pågår just nu tester och justeringar av flera ärenden. Bland annat undersöker vi just nu om låntagare automatiskt ska flyttas till en ny låntagarkategori baserat på låntagarens ålder. Exempelvis ska barn flyttas över till vuxna vid 18 år. Vi tittar även på att lånehistoriken ska anonymiseras 7 dagar efter återlämning för de låntagarkategorier som inte ska ha sparade lån. Detta är implementerat i testkoha och kommer snart sättas i gång i vår riktiga Koha.

Webben: Inget nytt har vi den här veckan att informera om.

Har ni frågor vill vi att ni skriver dem via: koha@biblio.se redaktion@biblio.se
Genom att nyttja ovanstående mailfunktioner så kan vi lättare se vilka frågor vi behöver kommunicera mer med er, göra lathundar till, eller lägga som en allmän information på ningen.

Marina Eklund
/Marina Eklund huvudprojektledare
marina eklund@norrboten.se Tel 072-238 18 14

BIBLIOTEKEN I NORRBOTTEN

Utskick 8 2022-09-11

Vad har vi jobbat med/hänt i veckan:
Här kommer aktuell information från veckans arbete med Kohasystem och webbportal.

IP-begränsning:
Införandet av begränsningsfiltret vid inloggning i systemet under föregående vecka, medförde att ett antal av er fick problem med inloggning i arbetsdatorn, då samtliga IP-nummer som är kopplade till era arbetsdatorer inte hade meddelats. Vi kan med det säga att begränsningsfunktionen fungerade, men med full förståelse för att det hindrade till viss del ert arbete. Kan informera om att det kom in 27 nya IP-adresser under förra veckan från flesta kommuner. De adresser som kom in till mig i fredags den 11 mars kommer att aktiveras lördag på eftermiddagen. Detta görs en gång/dag för att inte störa övriga delar i systemet.

Styrgruppen:
Styrgruppen kommer tillsammans med upphandlare på Region Norrbotten genomföra ett möte under veckan med ansvarig leverantör med anledning av de delar som inte implementerats enligt avtalet. Det rör sig bland annat om Reservationsordningen och depositionsfunktionen.

Webbportal/LOTS:
Det är nu möjligt för våra låntagare att pausa en reservation. I dagsläget heter knappen "Ändra utvalda reservationer".

Har ni frågor vill vi att ni skriver dem via: koha@biblio.se redaktion@biblio.se
Genom att nyttja ovanstående mailfunktioner så kan vi lättare se vilka frågor vi behöver kommunicera mer med er, göra lathundar till, eller lägga som en allmän information på ningen.

Marina Eklund
/Marina Eklund huvudprojektledare
marina eklund@norrboten.se Tel 072-238 18 14

Organisationen behöver få veta VAD, VARFÖR, HUR och NÄR.



Önskar Ni mer information kontakta

Marina Eklund
huvudprojektledare
Region Norrbotten/Biblioteken i Norrbotten
[marina.eklund@norrboten.se](mailto:marina eklund@norrboten.se)
Tel 072-2381814
